

Ausbildungsnachweis Nr. 22 Woche vom 29.01. bis 02.02. 96 Ausbildungs-jahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Ferienstunden	Gesamtstunden
Montag	Füße an Badewanne montiert		
	Tragegestell für Duschwanne montiert und aufgestellt, Dämmfolie an Wannenrändern angeklebt Wannen aufgestellt, Abfluß in HT-Rohr angeschlossen Wannen geerdet, Dämmfolienüberstand abgezogen		8
Dienstag	Abflußverstopfung mit Spirale beseitigt		
	Kaltwasserleitung aus PE, DN 50, im Graben verlegt und mit Sand umhüllt		8 1/2
Mittwoch	Waschtische mit Ventilen versehen		
	Verwandinstallationsgestelle angebracht Zuflußleitungen in Rohr-im-Rohr-System verlegt Druckprobe durchgeführt		8
Donnerstag	Abflußleitungen in HT-Rohr, DN 40 und DN 50 verlegt		
	Verwandinstallationsgestelle beplankt		8
Freitag	Verteiler montiert und an Garten- sowie Steigeleitungen angeschlossen		
	Baustelle und Werkstatt aufgeräumt Ausbildungsnachweis ausgefüllt		6
Sonntag			

Wochenstunden **38 1/2**


Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder
----------------	-----------------------------

Für die Richtigkeit

<p>02.02.96 Jürgen Muster Datum Unterschrift des Auszubildenden</p>	<p>15.03.1996 [Signature] Datum Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilder</p>
---	--

Zusätzlicher Fachbericht (Beschreibung, Skizze)

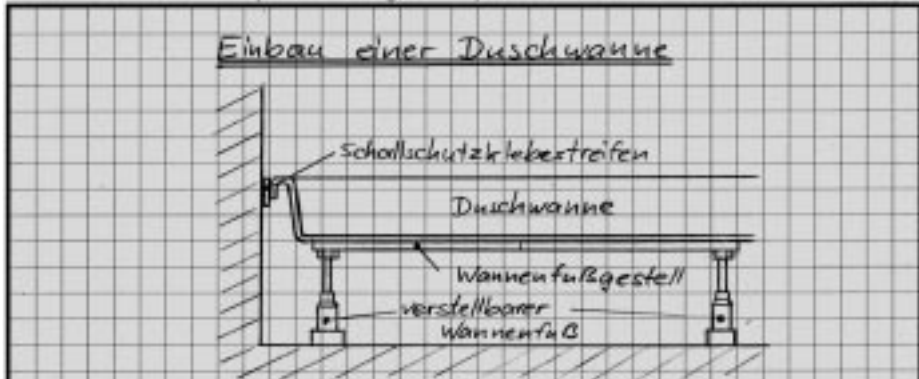

Arbeitsschritte:

- Wanne senkrecht stellen
- Schutzfolie von Klebestreifen auf dem Wannenfußgestell entfernen
- Wannenfußgestell auf Unterseite der Wanne kleben
- Schallschutzband auf wandanliegende Wannenränder kleben
- Wanne aufstellen und in die Waagerechte bringen
- höhenverstellbare Füße arretieren
- Ablaufgarnitur einbauen
- Abflußleitung installieren
- Überstehenden Schallschutzstreifen entfernen

Material:

- Duschwanne
- Wannenfußgestell
- Schallschutzklebeband
- Ablaufgarnitur
- HT-Abfluß-Formstücke
- HT-Rohr-Gleitmittel
- Abflußdichtungspaste

Werkzeug:

- Wasserwaage
- Gliedermaßstab
- Gabelschlüsselset
- Armaturenzange
