

Ausbildungsnachweis Nr. 52 Woche vom 08.04. bis 12.04.1996 Ausbildungs-jahr 2



Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Feiertag		
Dienstag	Durchbrüche durch Kellerwände geschlagen Leitungsführung für Trinkwasserhauptleitungen und Abwassersammelleitungen markiert Befestigungen der Leitungen markiert		8
Mittwoch	Gleit- und Festpunktschellen gesetzt SML-Rohre abgelängt Abwasserleitung aus SML-Rohr installiert		7½
Donnerstag	Abwassersammelleitung aus SML-Rohr installiert Trinkwasserhauptleitung aus Kupferrohr gelegt		7½
Freitag	Trinkwasserhauptleitung (warm) aus Kupfer- rohr verlegt Verteiler TW, kalt und warm, angebracht Ausbildungsnachweis geführt		7½
Samstag			

Wochenstunden **30½**

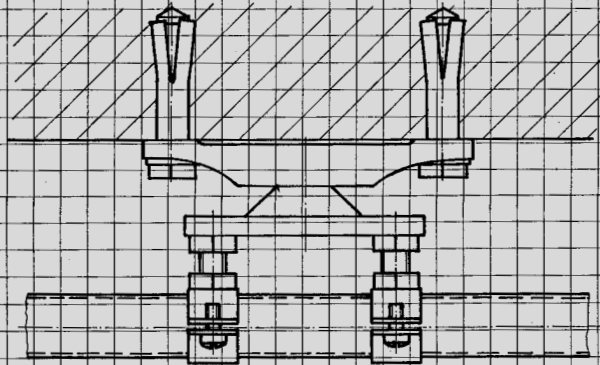
Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>12.04.96</u> Datum	 Unterschrift des Auszubildenden
<u>19.4.96</u> Datum	 Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders

Anbringen einer Festpunktschelle



Arbeitsschritte:

- Mitte der Festpunktschelle anzeichnen
- Bohrlöcher anzeichnen
- Dübellöcher bohren
- Dübel setzen
- Festpunktschelle anschrauben und leicht anziehen
- Richtung korrigieren
- Schrauben fest anziehen

Material:

- Festpunktschelle
- Schwerlastanker

Werkzeug:

- Gliedermaßstab
- Bleistift
- Schlagbohrmaschine und Hartmetallbohrer
- Gabelschlüsselset
