

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG

Ausbildungsnachweis Nr. 50 Woche vom 12.8. bis 16.8. 1996 Ausbildungs-
jahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Umrüst, Unterweisungen usw.	Einzel- Stunden	Gesamt- Stunden
Montag	Baustelle eingerichtet Heizkessel aufgestellt Heizkörper aufgehängt		
			7
Dienstag	Cu-Vor- und Rückleitungen 18x1 und 22x1 ver- legt und verpreßt Heizkörper angeschlossen		
			7 1/2
Mittwoch	Kachelofen-Gasbrenner ausgewechselt Arztbesuch		
			3
Donnerstag	Heiztherme gewartet und gereinigt Heizwasser nachgefüllt		
			7
Freitag	Rippenheizkörper demontiert Anschlüsse für Vor- und Rücklauf eines Handtuch- wärmekörpers verändert (Cu-Rohr 15x1) Aufhängung für Wärmekörper angebracht Wärmekörper aufgehängt und angeschlossen		
			7
Samstag			


Wochenstunden **31 1/2**

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>16.8.96</u> Datum <u>E. Zabudow</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>25.8.96</u> Datum <u>Walter Meißner</u> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilder
---	--

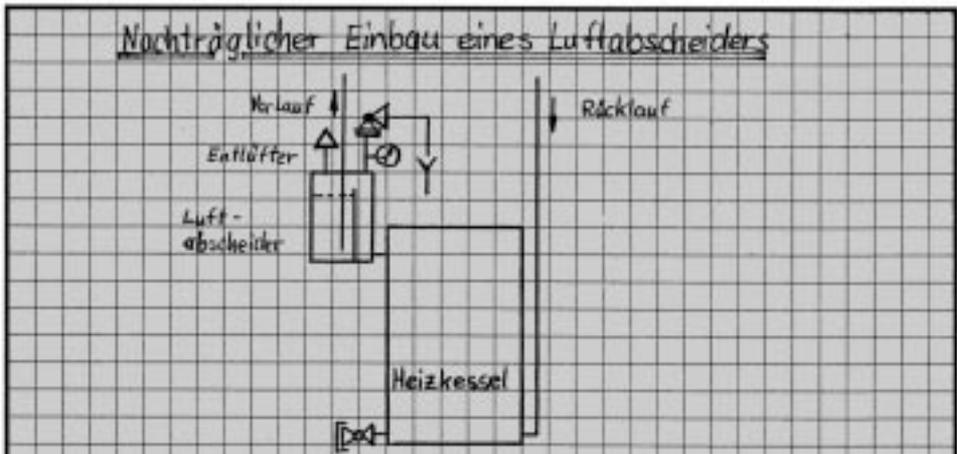

Arbeitsschritte:

- Entleeren der Heizungsanlage
- Lösen des Vorlaufanschlusses am Heizkessel
- Abmontieren des Vorlaufanschlußrohrstückes
- Montieren des Luftabscheiders an den Vorlaufanschluß des Heizkessels
- Verbinden des Luftabscheiders mit der Vorlaufleitung
- Verbinden der Ablaufleitung vom Sicherheitsventil zum Ablauftrichter
- Füllen der Heizungsanlage
- Entlüften der Anlage
- Prüfen der Anschlüsse auf Dichtigkeit
- Prüfen des Sicherheitsventiles auf Funktion
- Dämmen des neuen Vorlaufstückes
- Übergeben der Anlage an den Kunden

Material:

- Luftabscheider (Meibes GR), 1"
- Stahlrohrnippel, 1"
- Hanf
- Dichtungspaste
- Rohr Cu, 20x1
- Winkel Cu, DN20
- Lötübergangverschraubung DN20/R $\frac{3}{4}$ "
- Dämmschlauch (Armaflex), 20x35
- Lötzinn und -paste

Werkzeug und Hilfsmittel:

- Gliedermaßstab
- Markierer
- Rohrзangen
- Gabelschlüssel
- Messer
- Lötgerät
- Fallschlauch
