

Ausbildungsnachweis Nr. 39 Woche vom 27.05. bis 31.05.96 Ausbildungs-
jahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzel- Stunden	Gesamt- Stunden
Freitag			
Montag	Feiertag		
Dienstag	Kartusche an Einhandhebelmischer ausgetauscht Tassensifon ausgewechselt Stopfbuchse neu eingedichtet Perlatoren gereinigt		7
Mittwoch	Badezimmer accessoires angebracht Faltduschabtrennung angebracht Wannenfüll- und Brausebatterie ausgewech- selt		7
Donnerstag	Benzinabscheider und Ölabscheider eingebaut Ablaufleitungen von Waschanlage in verz. Stahlrohr 2" verlegt Pumpe für Hebeanlage angeschlossen		8
Freitag	Spüle angeschlossen mit Sifon ϕ 50 Spültischbatterie eingebaut und ange- schlossen Diermayer-Abgasklappe eingebaut		7
Samstag			
Wochenstunden			29


Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>31.05.96</u> Datum <i>Julien Muster</i> Unterschrift des Auszubildenden	<u>14.6.96</u> Datum <i>Gerhard Humpel</i> Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders
---	---

Anbringen von Badausstattungsgegenständen an Leichtbauwänden

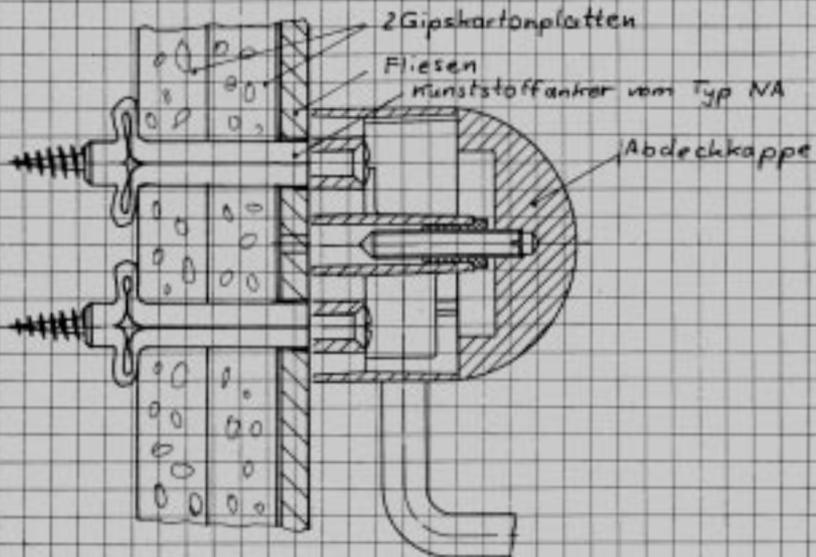

Arbeitsschritte:

- Abschrauben der Abdeckkappen von den Ausstattungsgegenständen
- Anzeichnen der Dübellöcher entsprechend dem Fliesenraster
- Ankönnen der Lochmittelpunkte
- Bohren der Dübellöcher
- Einsetzen der Hohlraumdübel
- Anschrauben der Ausstattungsgegenstände
- Anbringen der Abdeckkappen

Material:

- Handtuchhalter
- Seifenschale
- Ablage
- Spiegel
- Toilettenpapierhalter
- Hohlraumdübel Fischer NA 8x65 S mit Holzschrauben

Werkzeug:

- Marker, wasserlöslich
- Gliedermaßstab
- Wasserwaage
- Handnagel, 200g
- Körner
- elektr. Bohrmaschine mit Hartmetallbohrer $\varnothing 8$
- Schraubendreher
