

Beispiele für den Ausbildungsnachweis Sanitär

Ausbildungsnachweis Nr. 44 Woche vom 24.07. bis 28.07. 1995 Ausbildungsjahr 2

Tage	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Wochenstunden	Wochenstunden
Mittwoch	Warm- und Kaltwasserleitung in Cu 15x1 für Duschbatterie und Waschtisch verlegt, weichgelötet und wärme gedämmt		8
Dienstag	Duschwanne gesetzt und Abflußleitung mit HT-Rohr DN 50 an Falleitung angeschlossen Waschtisch-Abflußleitung mit HT-Rohr DN 50 an Falleitung angeschlossen		7 1/2
Mittwoch	Simsabdeckung ausgemessen Simsabdeckungsbleche zugeschnitten, Cu 0,7 dick Falzzugaben und Zugabe für Traufkantenumschlag angezeichnet Materialüberschüsse ausgeklippt		8
Dienstag	Simsabdeckungsbleche: Traufkantenumschlag hergestellt Falzzugaben aufgestellt Material zur Baustelle gebracht		7 1/2
Freitag	Traufbleche angebracht Simsabdeckungsbleche gefalzt, Wandanschluss aufgestellt, Bieche angebracht Kaplleisten befestigt und verfugt		9
Samstag			
		Wochenstunden	40


Sonderere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<p>28.07.95 Datum <u>Jürgen Maister</u> Auszubildender</p>	<p>28.07.95 Datum <u>Frank Schulte</u> Ausbildender bzw. Ausbilder</p>
--	--

Herstellen einer gefalzten Simsabdeckung

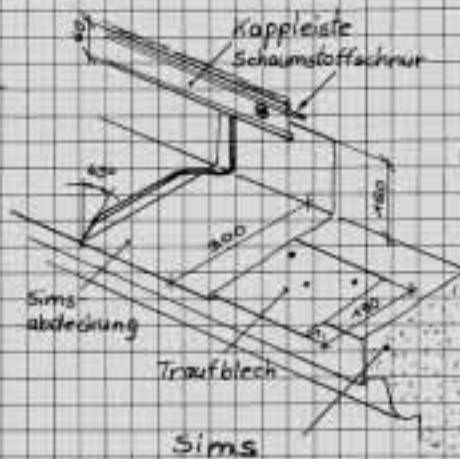

Falzherstellung:



Arbeitsschritte:

- Zuschnitt und Vorbereitung:
- Schlagschere auf Breite 480mm einstellen
 - Abdeckbleche zuschneiden
 - Falzugaben und Traufkantenumschlag anreißen
 - Ausklinken des überschüssigen Materials an den Vorderkanten
 - Aufstellen der Falzugaben
 - Abbiegen der Traufkanten umschlägen

Montage:

- Schnürschlag für Traufblech
- Anbringen der Traufbleche
- Zusammenfalzen der Abdeckbleche
- Umlegen des Falzes am Wandanschluß (ca. 170mm)
- Aufrichten des Wandanschlusses (150mm)
- Auftragen von Kaltkleber auf dem Sims
- Einhängen der Abdeckung in das Traufblech und Andrücken der Abdeckbleche am Sims
- Anbringen der Kappleiste
- Abdichten der Kappleistenfuge

Material:

- Kupferblech, 1000 x 2000, 0,7 d dick
- Traufbleche, Kupfer, 3000 x 0,7, Zuschnitt 250
- Kappleisten, Kupfer, 3000 x 13 x 60
- Halbrundschrauben mit Dichtscheibe und Kunststoffdübel
- Kaltkleber
- Schaumstoffdichtschür
- Silikon

Werkzeug:

- Schnur
- Schlagschere
- Abkantbank
- Ausklinkwerkzeug
- Anreiblehre
- Universalblechschere
- Schlaabphraschine mit Hartmetallbohrerset
- Falzzange
- Schaleisen
- Falzhammer
- Zahnpachtel
- Silikonspender
